CRONOGRAMA FISICO - MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS DE MADEIRA DO PARQUE ESTADUAL DO JUQUERY

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	**MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS DE MADEIRA DO PARQUE ESTADUAL DO JUQUERY**	**68 dias**	**Ter 01/03/22**	**Qui 02/06/22**
2	Ordem de inicio de serviços	1 dia	Ter 01/03/22	Ter 01/03/22
3	Placa de identificação para obra	7 dias	Qua 02/03/22	Qui 10/03/22
4	**GALPÃO 01**	**28 dias**	**Qua 09/03/22**	**Sex 15/04/22**
5	Retirada de telhamento em barro, cumeeira, agua furtada, forros de madeira e trama de madeira	5 dias	Qua 09/03/22	Ter 15/03/22
6	Execução de trama de madeira	8 dias	Qua 16/03/22	Sex 25/03/22
7	Instalação de telha de barro tipo italiana	7 dias	Seg 28/03/22	Ter 05/04/22
8	Execução de Cumeeira	3 dias	Qua 06/04/22	Sex 08/04/22
9	Instalação de agua furtada	2 dias	Seg 11/04/22	Ter 12/04/22
10	Imunizante para madeira	3 dias	Qua 13/04/22	Sex 15/04/22
11	**GALPÃO 02**	**28 dias**	**Seg 18/04/22**	**Qua 25/05/22**
12	Retirada de telhamento em barro, cumeeira, agua furtada, forros de madeira e trama de madeira	5 dias	Seg 18/04/22	Sex 22/04/22
13	Execução de trama de madeira	8 dias	Seg 25/04/22	Qua 04/05/22
14	Instalação de telha de barro tipo italiana	7 dias	Qui 05/05/22	Sex 13/05/22
15	Execução de Cumeeira	3 dias	Seg 16/05/22	Qua 18/05/22
16	Instalação de agua furtada	2 dias	Qui 19/05/22	Sex 20/05/22
17	Imunizante para madeira	3 dias	Seg 23/05/22	Qua 25/05/22
18	**ALOJAMENTO**	**2 dias**	**Ter 24/05/22**	**Qua 25/05/22**
19	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	2 dias	Ter 24/05/22	Qua 25/05/22
20	**VIGILANCIA**	**2 dias**	**Qui 26/05/22**	**Sex 27/05/22**
21	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	2 dias	Qui 26/05/22	Sex 27/05/22
22	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**3 dias**	**Seg 30/05/22**	**Qua 01/06/22**
23	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	2 dias	Seg 30/05/22	Ter 31/05/22
24	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	1 dia	Qua 01/06/22	Qua 01/06/22
25	**SEDE**	**1 dia**	**Qui 02/06/22**	**Qui 02/06/22**
26	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	1 dia	Qui 02/06/22	Qui 02/06/22
27	Termino da obra (Emissão do TRP - Termo de Recebimento Provisório)	0 dias	Qui 02/06/22	Qui 02/06/22

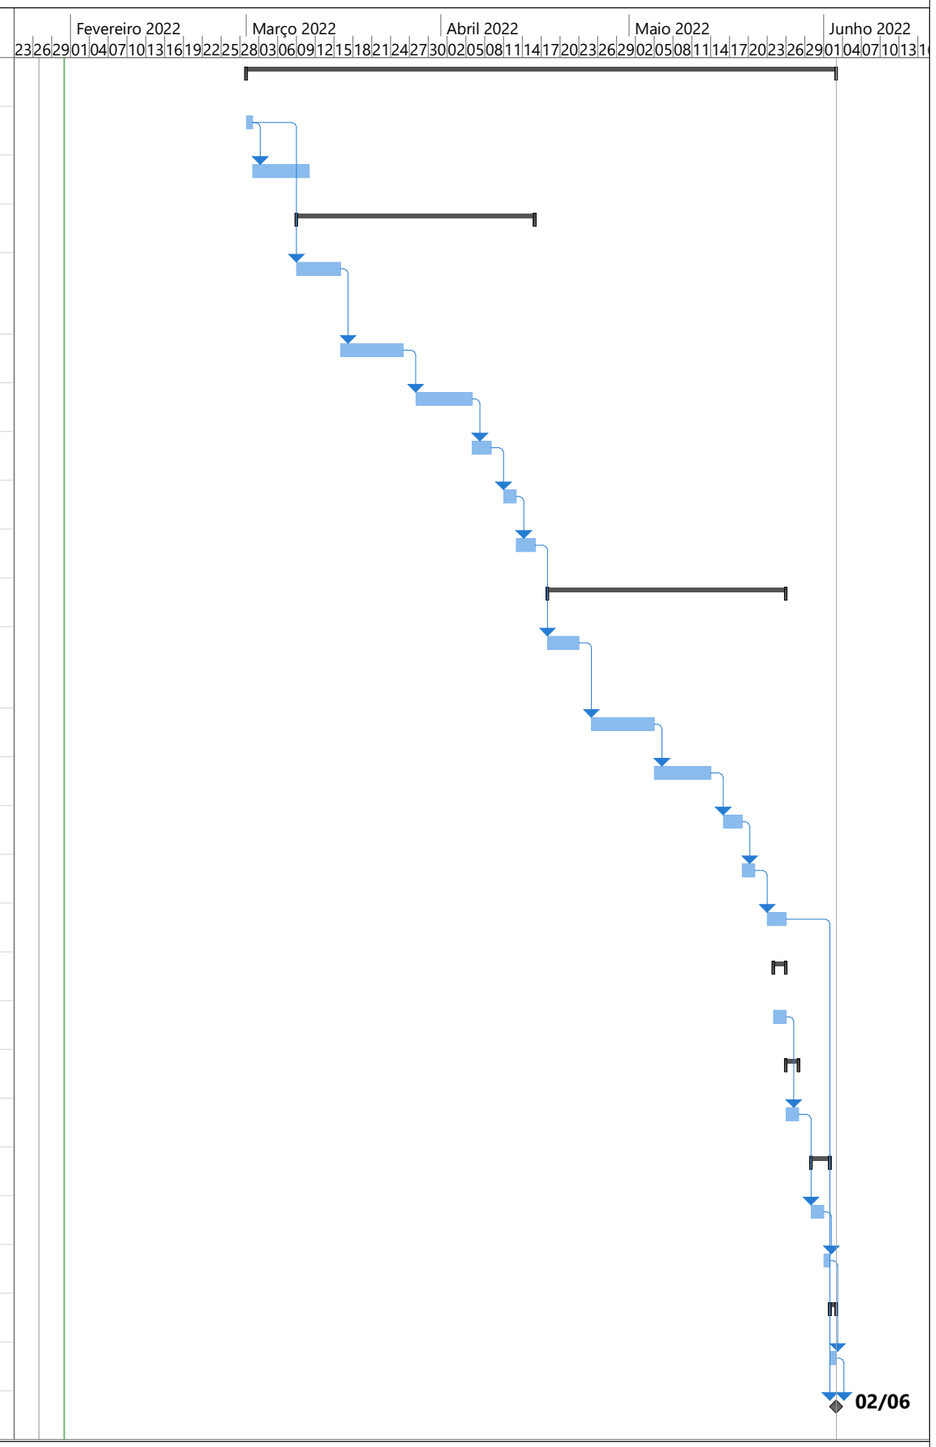

Projeto: Cronograma fisico_Ma
Data: Seg 31/01/22

Tarefa | Divisão | Marco | Resumo | Resumo do projeto | Tarefa Inativa | Marco Inativo | Resumo Inativo | Tarefa Manual | Somente duração | Acúmulo de Resumo Manual | Resumo Manual | Somente início | Somente término | Tarefas externas | Marco externo | Data limite | Andamento | Progresso manual
