CRONOGRAMA FÍSICO CENTRO CULTURAL KUNHAMBEBE
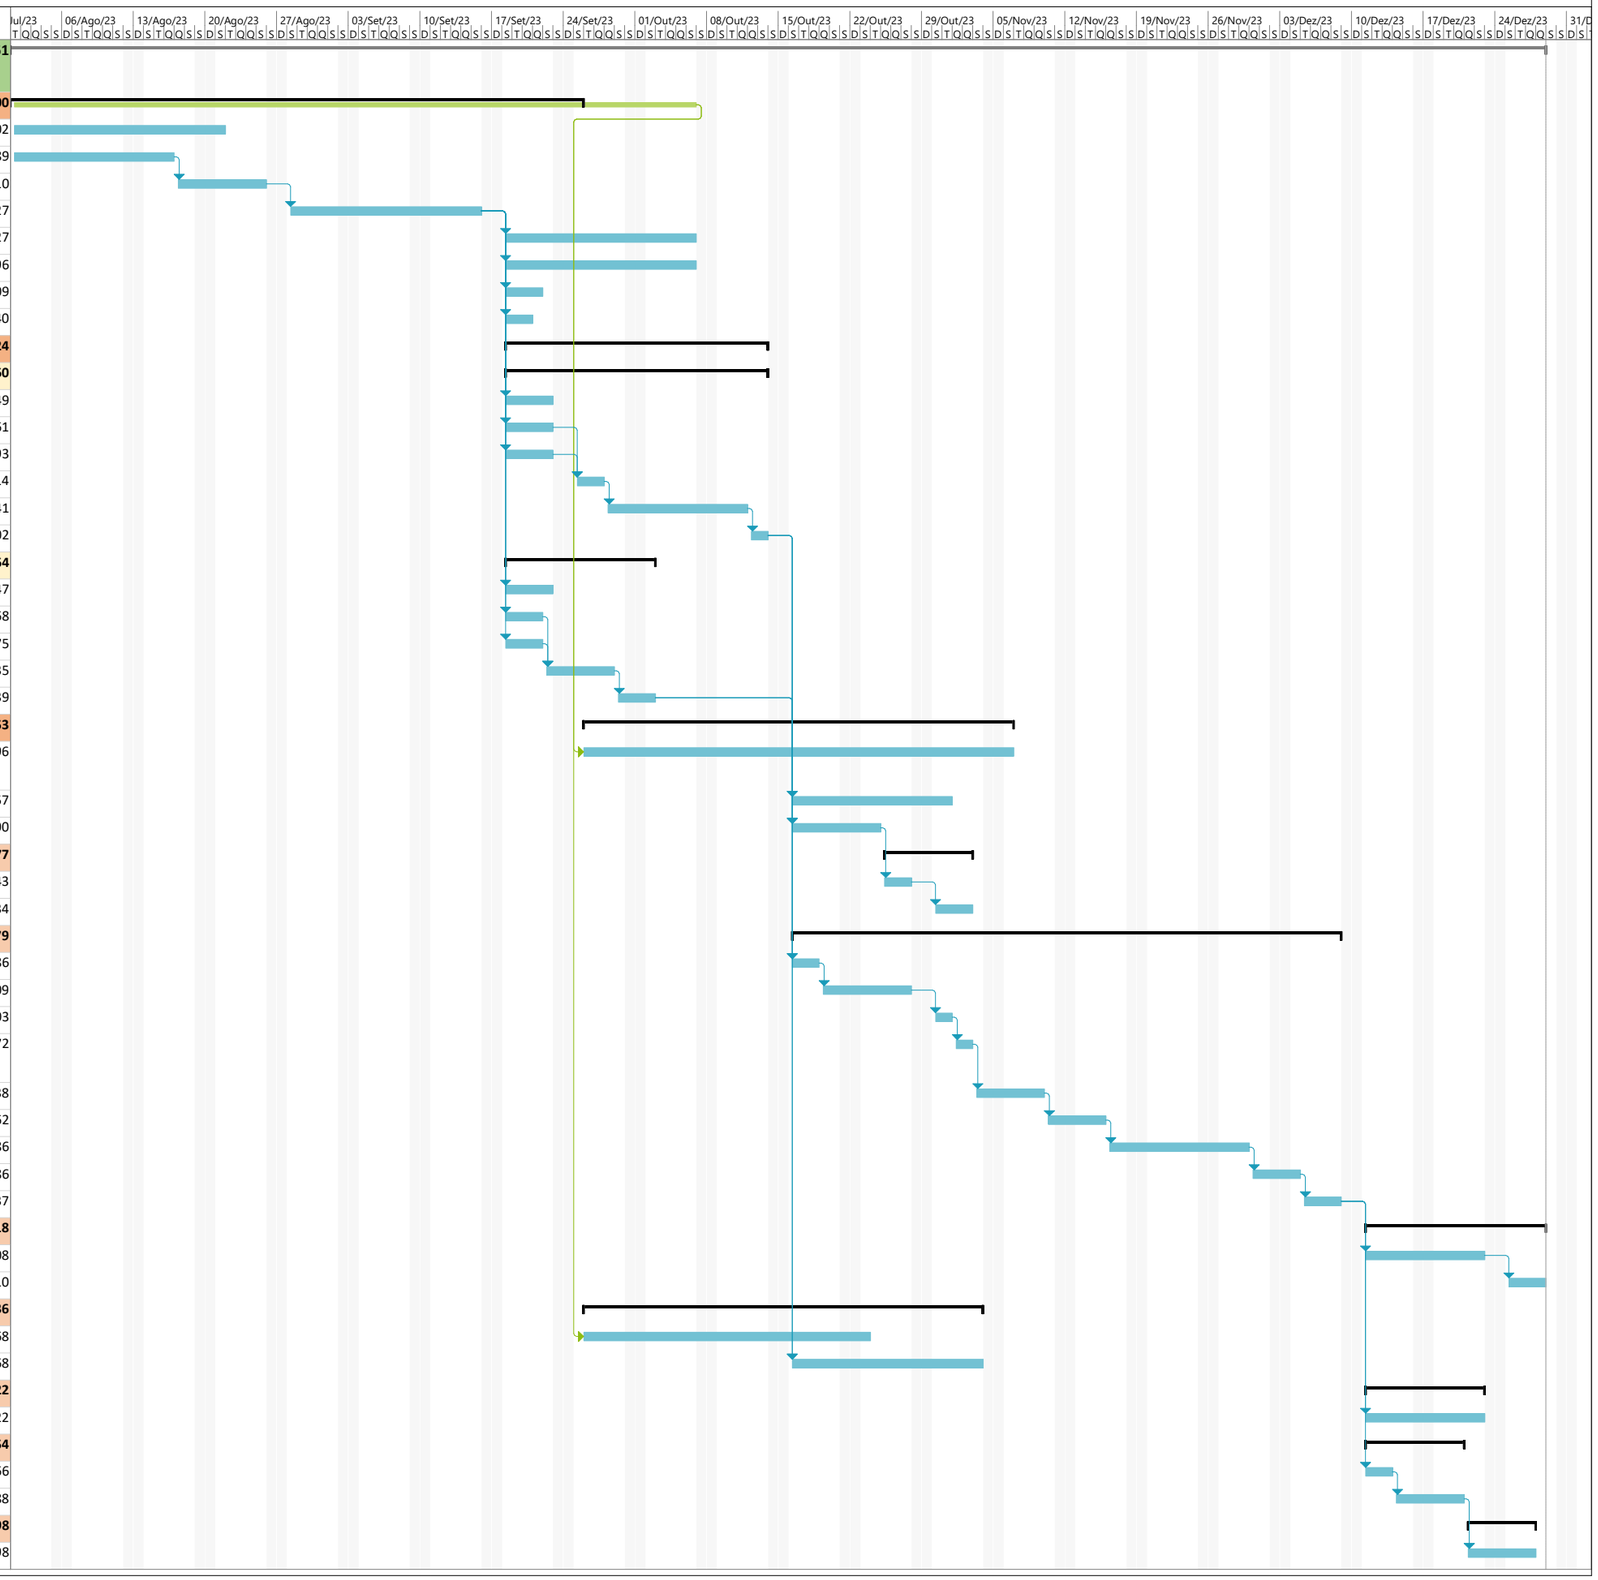
Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecesso	Custo
0		**Cronograma Centro Cultural Kunhambebe**	**108 dias**	**Ter 01/08/23**	**Qui 28/12/23**		**R$ 549.966,61**
1		**1 SERVIÇOS INICIAIS**	**40 dias**	**Ter 01/08/23**	**Seg 25/09/23**		**R$ 66.251,00**
2		1.1 Placa de obra	15 dias	Ter 01/08/23	Seg 21/08/23		R$ 14.702,02
3		1.2 Sondagem	12 dias	Ter 01/08/23	Qua 16/08/23		R$ 1.473,89
4		1.3 Parecer técnico de fundçaões	7 dias	Qui 17/08/23	Sex 25/08/23	3	R$ 8.526,10
5		1.4 Projeto de fundação	15 dias	Seg 28/08/23	Sex 15/09/23	4	R$ 3.146,27
6		1.5 Projeto estrutural	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23	5	R$ 3.146,27
7		1.6 Projeto arquitetura	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23	5	R$ 8.579,96
8		1.7 Limpeza de terreno	4 dias	Seg 18/09/23	Qui 21/09/23	5	R$ 5.121,09
9		1.8 Locação de obra	3 dias	Seg 18/09/23	Qua 20/09/23	5	R$ 21.555,40
10		**2 FUNDAÇÕES**	**20 dias**	**Seg 18/09/23**	**Sex 13/10/23**		**R$ 74.470,24**
11		**2.1 Sapatas**	**20 dias**	**Seg 18/09/23**	**Sex 13/10/23**		**R$ 66.556,60**
12		2.1.1 Escavação	5 dias	Seg 18/09/23	Sex 22/09/23	5	R$ 2.102,49
13		2.1.2 Corte e dobra aço	5 dias	Seg 18/09/23	Sex 22/09/23	5	R$ 37.415,61
14		2.1.3 Formas	5 dias	Seg 18/09/23	Sex 22/09/23	5	R$ 9.212,93
15		2.1.4 Concretagem	3 dias	Seg 25/09/23	Qua 27/09/23	14;13	R$ 17.207,14
16		2.1.5 Cura	10 dias	Qui 28/09/23	Qua 11/10/23	15	R$ 375,41
17		2.1.6 Desenforme	2 dias	Qui 12/10/23	Sex 13/10/23	16	R$ 243,02
18		**2.2 Vigas Baldrames**	**11 dias**	**Seg 18/09/23**	**Seg 02/10/23**		**R$ 7.913,64**
19		2.2.1 Escavação	5 dias	Seg 18/09/23	Sex 22/09/23	5	R$ 400,47
20		2.2.2 Corte e dobra aço	4 dias	Seg 18/09/23	Qui 21/09/23	5	R$ 3.340,68
21		2.2.3 Formas	4 dias	Seg 18/09/23	Qui 21/09/23	5	R$ 2.467,75
22		2.2.4 Concretagem	5 dias	Sex 22/09/23	Qui 28/09/23	21;20	R$ 1.536,35
23		2.2.5 Desenforme	2 dias	Sex 29/09/23	Seg 02/10/23	22	R$ 168,39
24		**3 ESTRUTURA**	**30 dias**	**Seg 25/09/23**	**Seg 06/11/23**		**R$ 81.338,53**
25		3.1 Aquisição e fornecimento de madeira	30 dias	Seg 25/09/23	Seg 06/11/23	1	R$ 48.805,96
26		3.2 Montagem estrutura	12 dias	Seg 16/10/23	Ter 31/10/23	17;23	R$ 32.532,57
27		3.3 Montagem telhado	7 dias	Seg 16/10/23	Ter 24/10/23	17;23	R$ 0,00
28		**4 COBERTURA**	**7 dias**	**Qua 25/10/23**	**Qui 02/11/23**		**R$ 35.672,77**
29		4.1 Instalação de manta	3 dias	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	27	R$ 10.197,43
30		4.2 Instalação de pentes em piaç	4 dias	Seg 30/10/23	Qui 02/11/23	29	R$ 25.475,34
31		**5 BASES E DEGRAUS**	**40 dias**	**Seg 16/10/23**	**Sex 08/12/23**		**R$ 145.049,79**
32		5.1 Nivelamento terreno	3 dias	Seg 16/10/23	Qua 18/10/23	17;23	R$ 7.910,86
33		5.2 Muro em gabião	7 dias	Qui 19/10/23	Sex 27/10/23	32	R$ 34.255,09
34		5.3 Aplicação de lona no solo	2 dias	Seg 30/10/23	Ter 31/10/23	33	R$ 1.536,03
35		5.4 Posicionamento de malha pop	2 dias	Qua 01/11/23	Qui 02/11/23	34	R$ 8.877,72
36		5.5 Concretagem	5 dias	Sex 03/11/23	Qui 09/11/23	35	R$ 40.036,38
37		5.6 Acabamento com niveladora	4 dias	Sex 10/11/23	Qua 15/11/23	36	R$ 6.668,62
38		5.7 Cura	10 dias	Qui 16/11/23	Qua 29/11/23	37	R$ 7.910,86
39		5.8 Juntas de dilatação	3 dias	Qui 30/11/23	Seg 04/12/23	38	R$ 7.910,86
40		5.9 Areia para arena	4 dias	Ter 05/12/23	Sex 08/12/23	39	R$ 29.943,37
41		**6 FECHAMENTOS E VEDAÇÕES**	**14 dias**	**Seg 11/12/23**	**Qui 28/12/23**		**R$ 67.872,18**
42		6.1 Fechamento em babu	10 dias	Seg 11/12/23	Sex 22/12/23	40	R$ 54.680,08
43		6.2 Instalação de portão de ferro	4 dias	Seg 25/12/23	Qui 28/12/23	42	R$ 13.192,10
44		**7 DECK**	**29,13 dias**	**Seg 25/09/23**	**Sex 03/11/23**		**R$ 38.847,36**
45		7.1 Aquisição entrega de madeira	20 dias	Seg 25/09/23	Seg 23/10/23	1	R$ 19.423,68
46		7.2 Instalação do deck	15 dias	Seg 16/10/23	Sex 03/11/23	17;23	R$ 19.423,68
47		**8 PINTURA**	**10 dias**	**Seg 11/12/23**	**Sex 22/12/23**		**R$ 14.832,22**
48		8.1 Aplicação de stain nas madei	10 dias	Seg 11/12/23	Sex 22/12/23	40	R$ 14.832,22
49		**9 ENTORNO EDIFICAÇÃO**	**8 dias**	**Seg 11/12/23**	**Qua 20/12/23**		**R$ 22.184,54**
50		9.1 Regularização de terreno	3 dias	Seg 11/12/23	Qua 13/12/23	40	R$ 2.673,66
51		9.2 Plantio de grama	5 dias	Qui 14/12/23	Qua 20/12/23	50	R$ 19.510,88
52		**10 LIMPEZA FINAL**	**5 dias**	**Qui 21/12/23**	**Qua 27/12/23**		**R$ 3.447,98**
53		10.1 Limpeza final de obra	5 dias	Qui 21/12/23	Qua 27/12/23	51	R$ 3.447,98
